

Руководитель
регионального проекта —
Набутовский Алексей Васильевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

"(D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	--	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом) Значение: 109,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе объектов КИИ Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2020	
3		Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом) Значение: 109, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Набутовский А. В.	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "предварительный прогноз" Информация мингосуправления АО от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 109 из 109.
1.1.	КРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.06.2020	01.05.2020	Набутовский А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация по КТ (01)" Информационная справка минэкономразвития АО от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Сбор информации о потребности органов ИОГВ АО и ОМСУ АО в кадрах в области информационной безопасности.	01.03.2020	01.03.2020	Кучина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе мероприятия" Информационная справка минэкономразвития АО от 01.03.2020г. №бн, приложен файл.
1.1.2	РРП		Сбор информации от образовательных организаций, расположенных на территории Астраханской области, осуществляющих обучение/переподготовку специалистов в области	01.05.2020	01.05.2020	Кучина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о мероприятии" Информационная справка минэкономразвития АО от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			информационной безопасности и их готовности к взаимодействию ИОГВ АО и ОМСУ АО.				
2.			Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти Астраханской области, в том числе объектов КИИ Значение: 24, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Набутовский А. В.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 24 из 24.
2.1.	КРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.05.2020	01.05.2020	Набутовский А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное мингосуправления АО от 01.05.2020г. № б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют.
2.1.1	РРП		Анализ существующего уровня защищенности информационных систем и/или объектов КИИ, в том числе уровня обеспечения их доступности.	01.05.2020	01.05.2020	Кучина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" минэкономразвития АО от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют.
2.1.2	РРП		Подготовка проекта создания центра мониторинга событий информационной безопасности (ЦМСИБ), в том числе определение технических решений и формирование требований к подразделению (учреждению) и финансово-	01.04.2020	01.04.2020	Кучина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" минэкономразвития АО от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			экономическое обоснование.				
3.			Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области Значение: 70, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Набутовский А. В.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 70 из 70.
3.1.	КРП		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.03.2020	01.03.2020	Набутовский А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное минэкономразвития АО от 01.03.2020г. № б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют.
3.1.1	РРП		Подготовка возможных решений по обеспечению перехода на отечественное ПО ИОГВ АО и ОМСУ АО, на основе анализа используемого программного обеспечения ИОГВ АО и ОМСУ АО, и сформированного перечня программного обеспечения подлежащего замене.	01.03.2020	01.03.2020	Кучина О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация" Иное минэкономразвития АО от 01.03.2020г. № б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

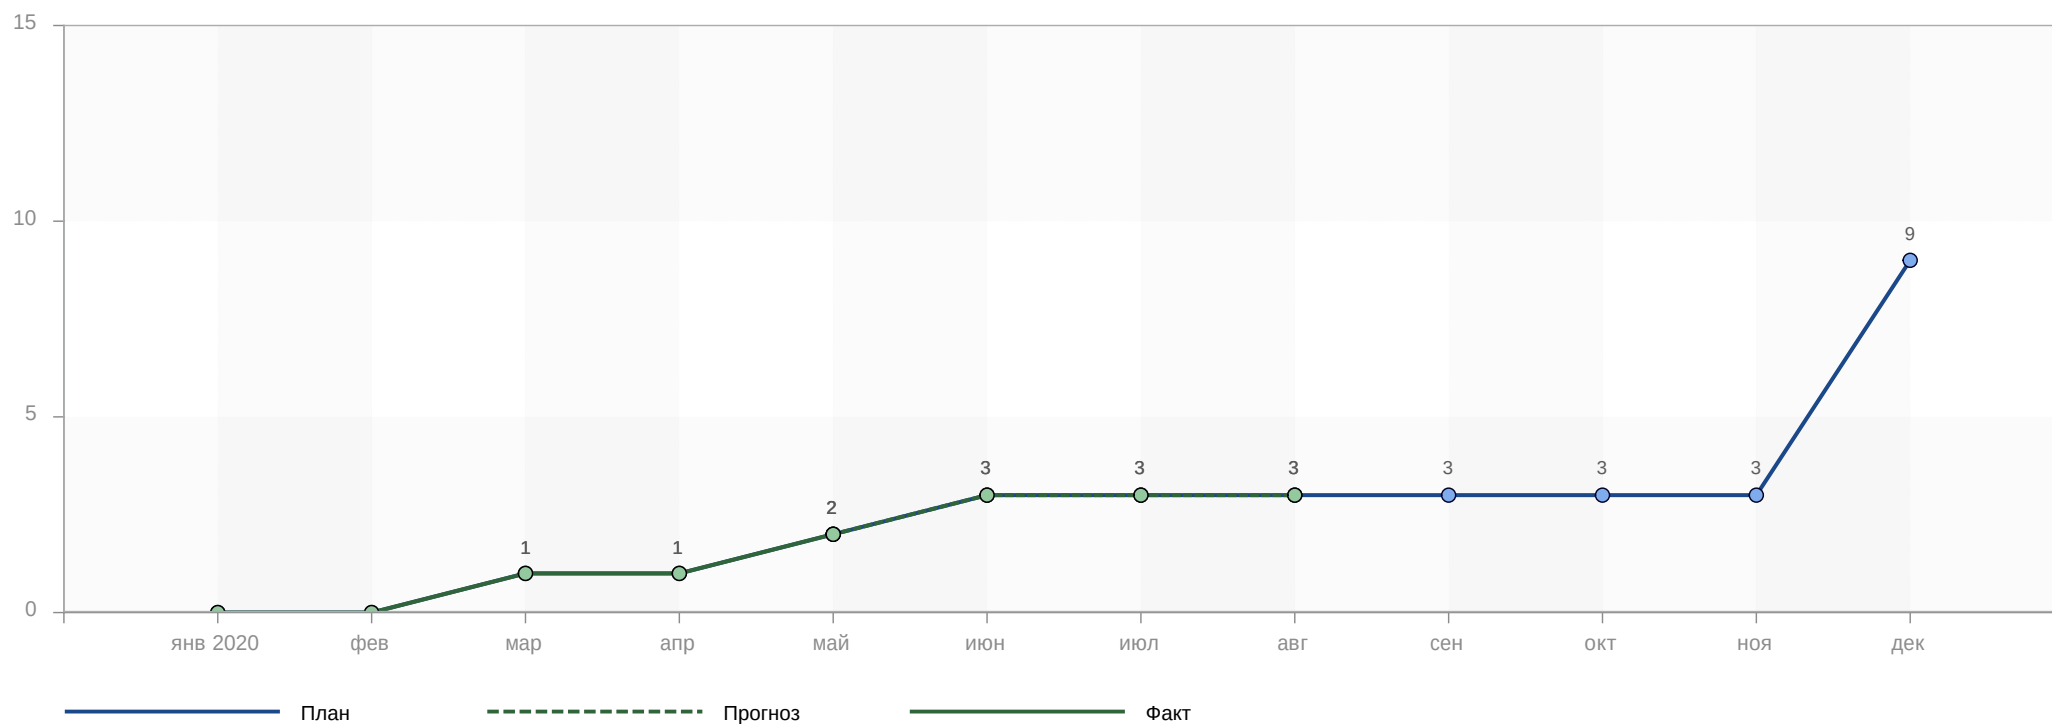
Динамика достижения контрольных точек

Рис. 1. "(D4-12) Информационная безопасность (Астраханская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
